

**Акт № 4**  
**о результатах контроля за исполнением соглашения**  
**о муниципально-частном партнерстве**  
**№ 059-15-09/3-416 от 15.03.2022**

**Дата, время и место составления акта:**

29.03.2023 года, 17.00, г. Пермь, ул. Ленина, 27в

**Проверяющие:**

Онькова Вера Владимировна – заместитель председателя комитета-начальник отдела развития физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми;

Костарева Екатерина Валерьевна – начальник сектора по развитию имущественного комплекса отдела развития физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми;

Голдобина Ирина Юрьевна – главный специалист сектора по развитию имущественного комплекса отдела развития физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми.

**Наименование публичного партнера:**

муниципальное образование город Пермь, от имени которого выступает администрация города Перми в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее - комитет).

**Наименование проверяемого частного партнера:**

общество с ограниченной ответственностью «Мира Инвест» (далее – ООО «Мира Инвест», общество).

**Срок и место проведения контрольных мероприятий:**

28.03.2023, г. Пермь, ул. Подлесная, 41

**Период проведения контрольных мероприятий:**

27.03.2023-29.03.2023.

**Описание результатов контрольного мероприятия:**

28.03.2023 представители комитета совместно с директором ООО «Мира Инвест» Впориным А.С. выехали по адресу: ул. Подлесная, 41 в целях проведения контрольного мероприятия - выездной плановой проверки по выполнению работ по строительству спортивного комплекса на ул. Подлесная, 41 в Дзержинском районе г. Перми, в соответствии с соглашением о муниципально-частном партнерстве № 059-15-09/3-416 от 15.03.2022.

На момент проверки ведутся работы по строительству спортивного комплекса (Приложение № 1 к настоящему акту).

Выполняются работы по строительству электрической сети для питания спортивного объекта, завершён монтаж трассы газа и строительства газовой котельной, завершён монтаж инженерных сетей внутри здания, идет подготовка к внутренней отделке, идет подготовка к благоустройству территории и строительству открытой спортивной площадки (теннисного корта).

ООО «Мира Инвест» получены технические условия на присоединение к электрическим сетям № 43-ТУ-31234 от 25.05.2022. Счет 4300076532 за осуществление технического присоединения оплачен 09.06.2022. Срок подключения ПАО «МРСК Урала» по договору истек в ноябре 2022 года. Без подключения к электрическим сетям продолжение строительства объекта не представлялось возможным.

В связи с возникшей задержкой подключения к электрическим сетям обществом в адрес комитета направлено письмо от 14.02.2023 № 059-15-01-17-26. Комитетом информация о потребности скорейшего подключения направлена в филиал «Пермэнерг» ОАО «МРСК-Урала» письмом от 10.03.2023 № 059-15-01-18-271.

Работы по строительству электрической сети для питания спортивного объекта ПАО «МРСК Урала» начаты в марте 2023.

**Факты несоблюдения условий соглашения (при выявлении):**

Факты несоблюдения условий соглашения ООО «Мира Инвест» не выявлены.

**Фактические результаты проведения контрольного мероприятия**


Ведутся работы по строительству спортивного комплекса на ул. Подлесная, 41.

**Подписи проверяющих:**

Опькова В.В.

Костарева Е.В.

Голдобина И.Ю.




**Сведения об ознакомлении частного партнера (руководителя) с актом о результатах контроля:**


Втюрин А.С.



Приложение № 1  
к акту № 3 от 29.03.2023  
о результатах контроля за исполнением  
соглашения о муниципально-частном партнерстве  
№ 059-15-09/3-416 от 15.03.2022



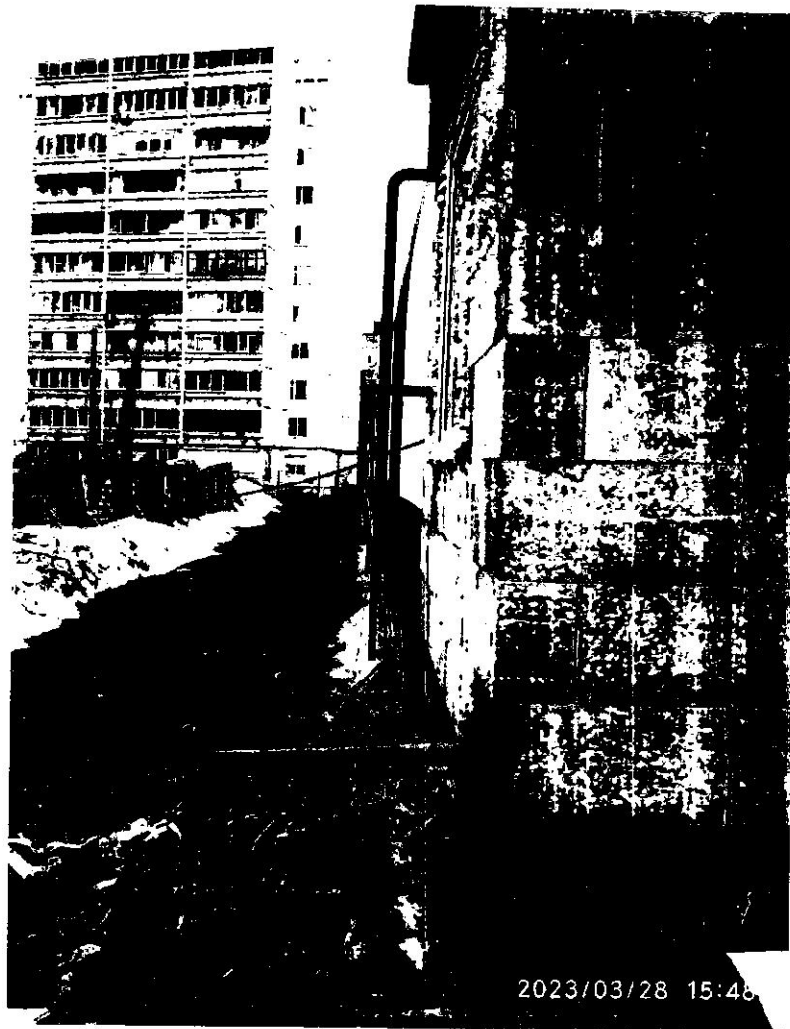

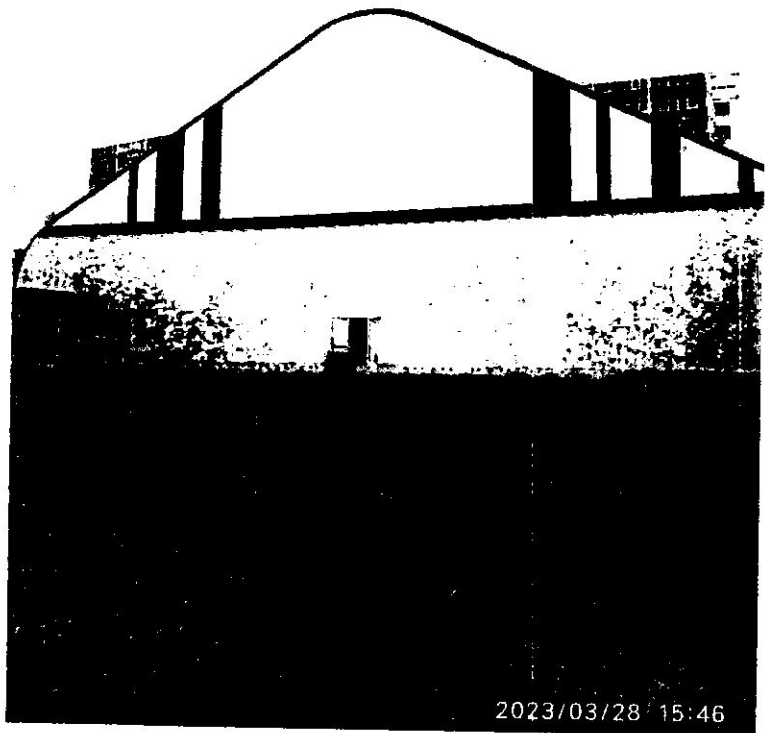



**Акт № 5**  
**о результатах контроля за исполнением соглашения**  
**о муниципально-частном партнерстве**  
**№ 059-15-09/3-416 от 15.03.2022**

**Дата, время и место составления акта:**

23.06.2023 года, 16.00, г. Пермь, ул. Ленина, 27в

**Проверяющие:**

Сапегин Сергей Викторович – председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми;

Онькова Вера Владимировна – заместитель председателя комитета-начальник отдела развития физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми;

Костарева Екатерина Валерьевна – начальник сектора по развитию имущественного комплекса отдела развития физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми;

Голдобина Ирина Юрьевна – главный специалист сектора по развитию имущественного комплекса отдела развития физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми.

**Наименование публичного партнера:**

муниципальное образование город Пермь, от имени которого выступает администрация города Перми в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее - комитет).

**Наименование проверяемого частного партнера:**

общество с ограниченной ответственностью «Мира Инвест» (далее – ООО «Мира Инвест», общество).

**Срок и место проведения контрольных мероприятий:**

23.06.2023, г. Пермь, ул. Подлесная, 41

**Период проведения контрольных мероприятий:**

21.06.2023-23.06.2023.

**Описание результатов контрольного мероприятия:**

23.06.2023 представители комитета совместно с директором ООО «Мира Инвест» Втюриным А.С. выехали по адресу: ул. Подлесная, 41 в целях проведения контрольного мероприятия - выездной плановой проверки по выполнению работ по строительству спортивного комплекса на ул. Подлесная, 41 в Дзержинском районе г. Перми, в соответствии с соглашением о муниципально-частном партнерстве № 059-15-09/3-416 от 15.03.2022.

На момент проверки ведутся работы по строительству спортивного комплекса (Приложение к настоящему акту).

Идет монтаж инженерных сетей, монтаж освещения, залита бетонная плита внутри здания спортивного комплекса. Ведется работа по укладке финишного покрытия теннисита на открытых площадках. Ведется подготовка к благоустройству территории, асфальтированию парковки и монтажу забора вдоль здания спортивного комплекса.

**Факты несоблюдения условий соглашения (при выявлении):**  
Факты несоблюдения условий соглашения ООО «Мира Инвест» не выявлены.

**Фактические результаты проведения контрольного мероприятия**  
Ведутся работы по строительству спортивного комплекса на ул. Подлесная, 41.

**Подписи проверяющих:**

Сапегин С.В.

Онькова В.В.

Костарева Е.В.

Голдобина И.Ю.

**Сведения об ознакомлении частного партнера (руководителя) с актом о результатах контроля:**

Втюрин А.С.

Один экземпляр акта получен на руки  
05.07.2023




Приложение  
к акту № 5 от 23.06.2023  
о результатах контроля за исполнением  
соглашения о муниципально-частном партнерстве  
от 15.03.2022 № 059-15-09/3-416









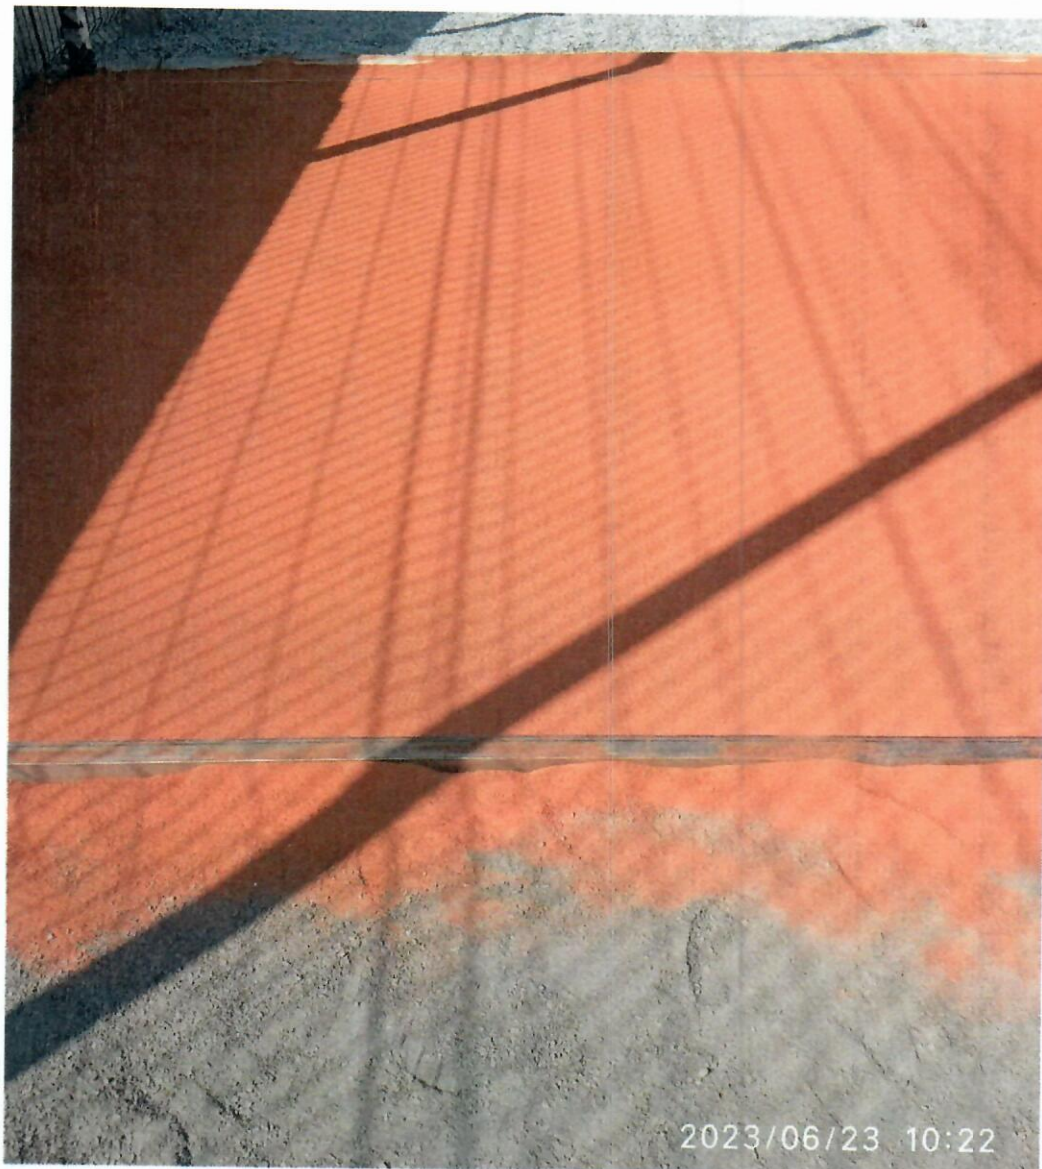



**Акт № 6**  
**о результатах контроля за исполнением соглашения**  
**о муниципально-частном партнерстве**  
**№ 059-15-09/3-416 от 15.03.2022**

**Дата, время и место составления акта:**

27.09.2023 года, 11.30, г. Пермь, ул. Ленина, 27в

**Проверяющие:**

Сапегин Сергей Викторович – председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми;

Онькова Вера Владимировна – заместитель председателя комитета-начальник отдела развития физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми;

Костарева Екатерина Валерьевна – начальник сектора по развитию имущественного комплекса отдела развития физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми;

**Приглашенные:**

Пименова Ирина Геннадьевна – заместитель начальника департамента экономики и промышленной политики администрации города-начальник управления промышленности, инвестиций и предпринимательства департамента экономики и промышленной политики администрации города.

**Наименование публичного партнера:**

муниципальное образование город Пермь, от имени которого выступает администрация города Перми в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее - комитет).

**Наименование проверяемого частного партнера:**

общество с ограниченной ответственностью «Мира Инвест» (далее – ООО «Мира Инвест», общество).

**Срок и место проведения контрольных мероприятий:**

27.09.2023, г. Пермь, ул. Подлесная, 41

**Период проведения контрольных мероприятий:**

25.09.2023-27.09.2023.

**Описание результатов контрольного мероприятия:**

27.09.2023 представители комитета совместно с директором ООО «Мира Инвест» Втюриным А.С. выехали по адресу: ул. Подлесная, 41 в целях проведения контрольного мероприятия - выездной плановой проверки по выполнению работ по строительству спортивного комплекса на ул. Подлесная, 41 в Дзержинском районе г. Перми, в соответствии с соглашением о муниципально-частном партнерстве № 059-15-09/3-416 от 15.03.2022.

На момент проверки завершены работы по строительству спортивного комплекса, завершены работы по устройству открытой площадки (Приложение к настоящему акту).

Идет внутренняя отделка помещений. Начата работа по укладке подложки для теннисного покрытия хард на закрытой площадке.

**Факты несоблюдения условий соглашения (при выявлении):**  
Факты несоблюдения условий соглашения ООО «Мира Инвест» не выявлены.

**Фактические результаты проведения контрольного мероприятия**  
Завершены работы по строительству спортивного комплекса на ул. Подлесная, 41, требуется окончание отделки помещений.

**Подписи проверяющих:**

Сапегин С.В.

Онькова В.В.

Костарева Е.В.

**Сведения об ознакомлении частного партнера (руководителя) с актом о результатах контроля:**

Втюрин А.С.





Приложение  
к акту № 6 от 27.09.2023  
о результатах контроля за исполнением  
соглашения о муниципально-частном партнерстве  
от 15.03.2022 № 059-15-09/3-416





