

Календарный план капитального ремонта

Γραφική παραγωγή από τον

№	Наименование работ	Продовольственные, чел.см.		Строит. машины	Состав бригады		Кол-во рабочих в смену	Смен. продолж-ности	Примеч.
		Расчет.	Прин.		Профессия, разряд	Кол.			
1	2	3	4	5	7	8	6	9	10
1	Подготовительные работы	21,61	22				11	1	2
2	Демонтажные работы	99,44	99		кровельщик 2р, 5р плотник 2р, 3р комнатник 3р плотничник 3р об. сист. мат. 2р. 2 1 3 1	1 1 2 1	9	1	11
3	Устройство плоской кровли	90,44	90		кровельщик 2р, 3р монтижник 3р, 4р монтижник 2р, 3р плотник 2р, 3р, 5р комнатник 3р 1, 1 1, 1 2, 2 2, 1, 1	1 1 1 2 2	6	1	15
4	Устройство стропильной системы и крыши	79,88	80		термоизоляционный 2р, 3р, 4р 1, 1, 2		10	1	8
5	Утепление перекрытия	8,17	8				4	1	2
6	Заполнение проемов	31,81	32		монтижник 2р, 4р 2, 2		4	1	8
7	Санитарно-технические работы	15,93	16		сборщик 4р. слесарь 4р. слесарь 3р. 1 2 1		4	1	4
8	Электромонтажные работы	29,64	30		электрик 5р. электрик 4р. 3 3		6	1	5
9	Средства связи и сигнализации	12,23	12				4	1	3
10	Внутренняя отделка	112,06	112		плотник 2р, 4р об. сист. мат. 2р, 3р плотничник 3р, 4р штукатур 3р, 4р 3 2 2 1 1		14	1	8
11	Устройство наружных коммуникаций	16,17	16		сантехник 4р монтижник 4р. землекоп 3р. 1 2 1		4	1	4
12	Наружная отделка	72,2	72		специалист по наружным фасадам 8		8	1	9
13	Сборка и навеска водостока	7,52	8		кровельщик 4р. 2		2	1	4
14	Устройство отмостки	10,34	10		асфальтобетонщик 2р, 4р. 1, 1		2	1	5
15	Благоустройство и озеленение	6,4	6		разнорабочий 6		6	1	1
16	Прочие неучтенные работы	889,82							
17	Подготовка объекта к сдаче	4,32	4				4	1	1

График работы машин и механизмов

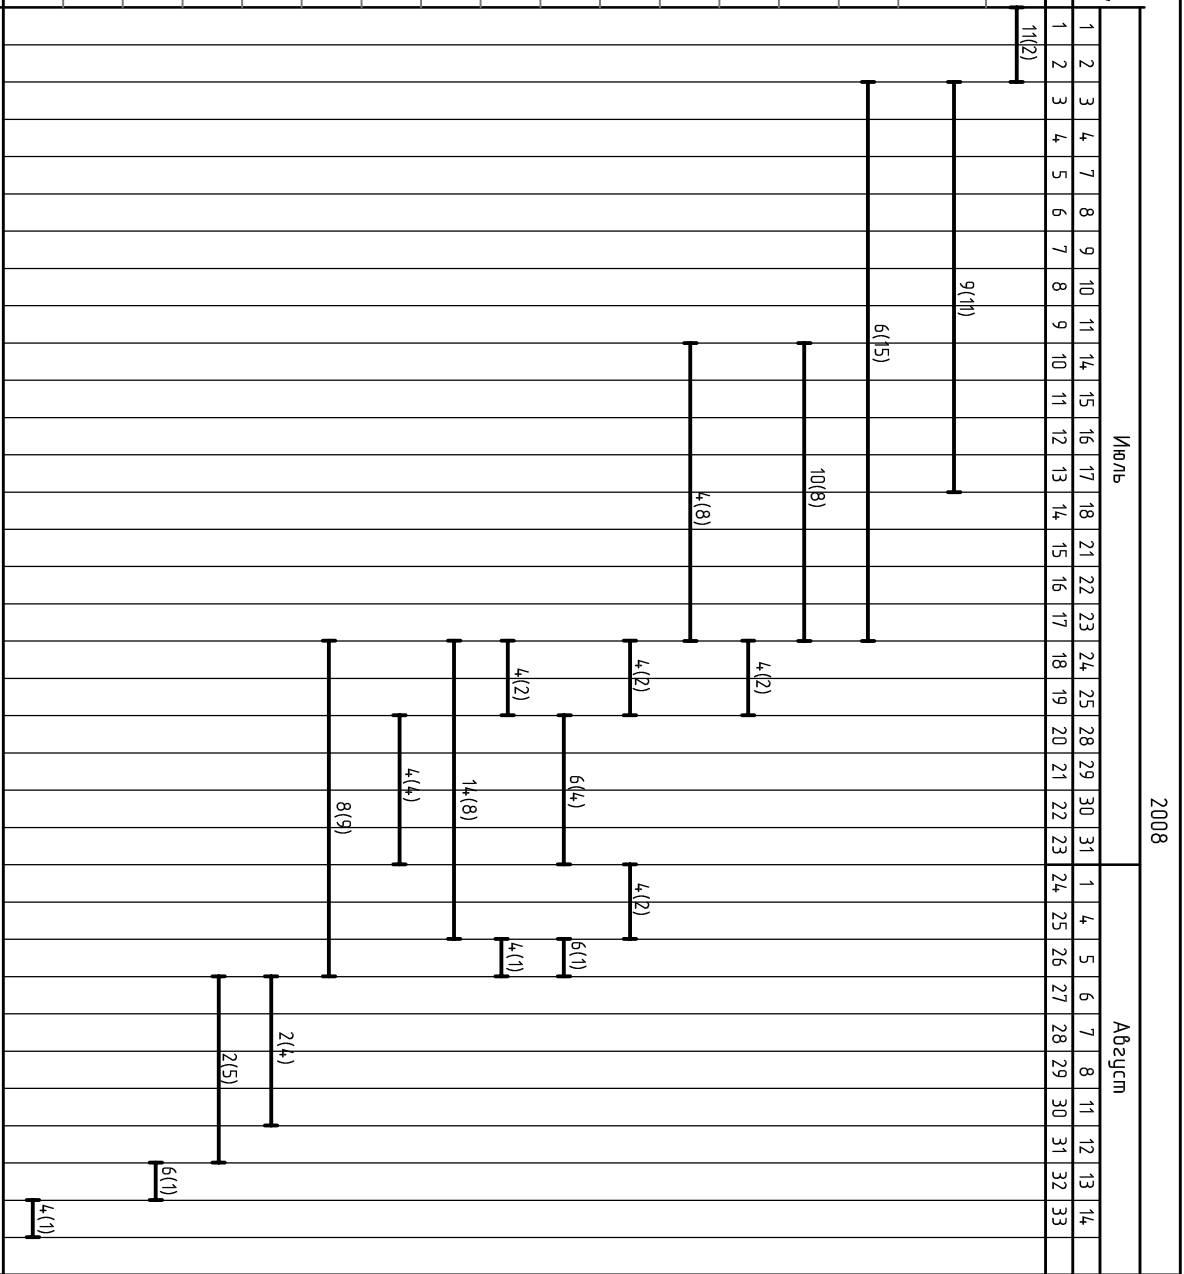
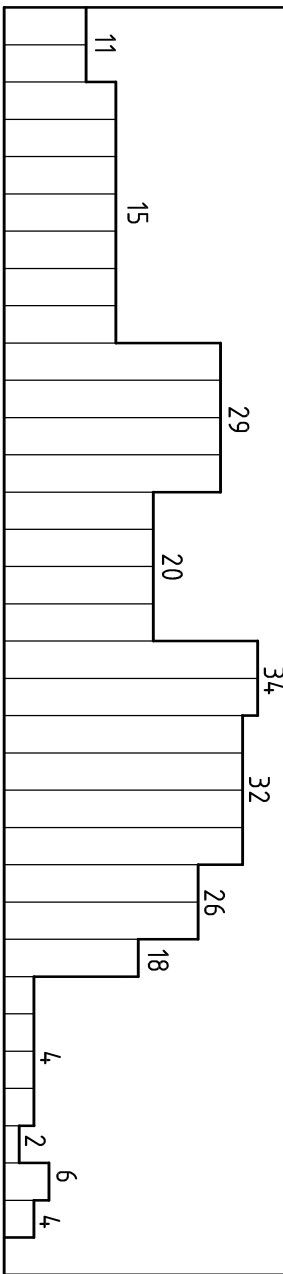
[illegible]

График движения рабочей силы

[illegible]
$$N_{cp} = Q_{np} / t = 609 / 33 = 18.45$$
$$K_{\text{нер.}} = N_{\text{max.}} / N_{\text{ср.}} = 34 / 18.45 = 1.84$$

Согласовано:

Взам. цнв. №

Подг. и дата

Инв. № подл.
